



Transformação da Plataforma Muroa em 180 dias

Plano de liderança para gerar capacidade, resiliência, modernização e autonomia sustentável

Quatro ondas de execução conectadas, com foco em pessoas, operação, negócio e evolução da plataforma

FRENTES DE TRABALHO	1 0–30 dias Diagnosticar e pactuar	2 31–60 dias Organizar e estabilizar	3 61–90 dias Ganhar tração e evidenciar valor	4 91–180 dias Escalar, consolidar e delegar	RESULTADOS ESPERADOS
 Pessoas, capacidade e IA	• Mapear papéis, skills e pontos críticos • Diagnóstico de capacidade e sobrecarga • Plano inicial de IA com baseline do fluxo	• Rebalancear Run x Change x Modernização • Definir owners e backups por frente • Piloto de IA em problema real, com métrica	• Upskilling em Muroa, nuvem e dados • Mentoria e comunidades de prática • Métricas de autonomia e engajamento	• Time mais autônomo e capacitado • Sucessores em frentes-chave • IA incorporada onde houver evidência de valor	 Time autônomo, capacitado e orientado a valor
 Resiliência e observabilidade	• Inventário de serviços, jornadas e dependências • Definir SLOs/SLAs críticos • Quick wins de logging, métricas e playbooks	• Dashboards e alertas prioritários • Logs, métricas e traces mínimos • Rotina de incidentes e problemas	• Observabilidade ponta a ponta • Redução de incidentes recorrentes • Planos de capacidade e confiabilidade	• Operação previsível e mais estável • Post-mortem blameless e melhoria contínua • Resiliência como rotina do time	 Operação resiliente e observável de ponta a ponta
 Modernização, legado e FinOps	• Mapa do legado e custos AWS • Priorização por valor, risco e esforço • Roadmap macro até 2028	• Right sizing e cortes de desperdício • Ondas iniciais de modernização • Política inicial de FinOps	• Entregas iniciais de modernização • Ganhos mensuráveis de custo • Plano de retirada do legado validado	• Roadmap 2028 protegido • FinOps incorporado à governança • Custos mais previsíveis e sustentáveis	 Plataforma mais eficiente e custo-efetiva
 Áreas consumidoras e ecossistema Muroa	• Mapear consumidores, dependências e dores • Entender compromissos e conflitos de prioridade • Alinhamento inicial com fornecedor	• Roadmap compartilhado com consumidores • Critérios claros de escalonamento • Negociação transparente de trade-offs	• Compromissos mais previsíveis • Redução de conflitos e retrabalho • Decisões baseadas em dados e contexto	• Ecossistema mais alinhado ao valor • Relação mais produtiva com fornecedor • Governança estável com áreas parceiras	 Ecossistema alinhado e menos reativo
 Estratégia e liderança	• Traduzir KRs em plano de 180 dias • Definir metas, indicadores e renúncias • Estabelecer governança e cadência	• Acompanhar execução por evidências • Remover impedimentos sistêmicos • Comunicação executiva simples e frequente	• Delegação progressiva com contexto e limites • Fóruns de decisão do próprio time • Aprendizado com erros e acertos	• Menos centralização na coordenação • Time decide mais sem depender da liderança • Liderança distribuída e escalável	 Liderança leve, governança clara e resultados contínuos

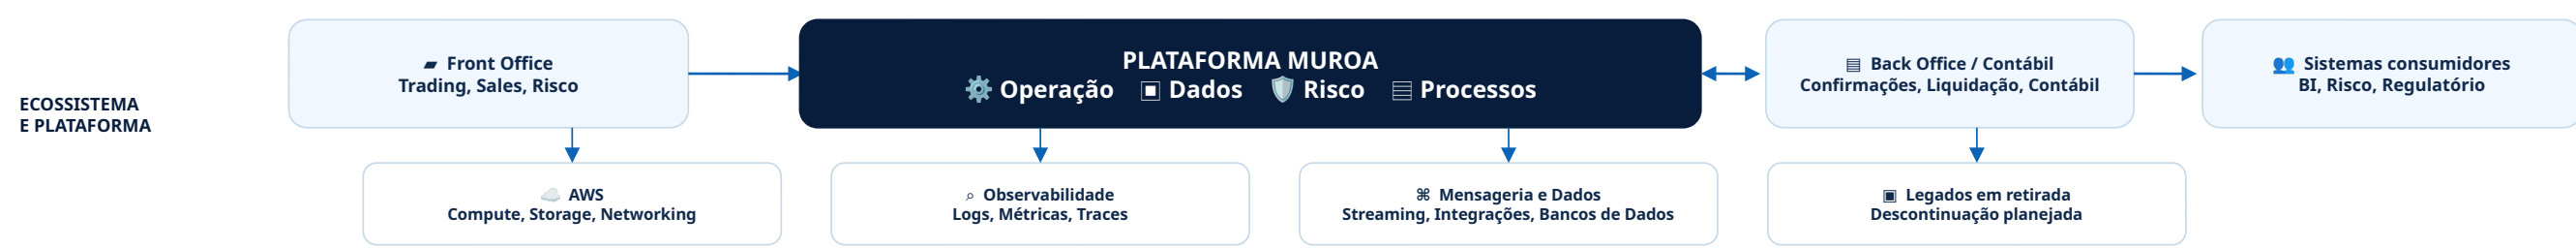

Escolhas, renúncias e governança do plano

A execução dos 180 dias precisa deixar claro o que será priorizado, quem decide e quais evidências provam avanço.

1

Capacidade real antes de nova demanda
Separar Run x Change x Modernização e negociar trade-offs sem criar capacidade fictícia.

2

Valor, risco e custo orientam a prioridade
Modernização e FinOps avançam por evidências, não por lista técnica.

3

Autonomia sustentável do time
Coordenação cria contexto, limites e cadência; o time assume decisões progressivamente.

Decisões que eu tomaria como coordenação

Escolhas de foco

- Proteger capacidade para transformação
- Priorizar jornadas críticas e risco operacional
- Modernizar por ondas até 2028
- Aplicar IA em problema real, com baseline e métrica
- Dar visibilidade executiva simples e frequente

Renúncias explícitas

- Não modernizar tudo ao mesmo tempo
- Não aceitar tudo como prioridade
- Não centralizar decisões operacionais
- Não manter manualidade sem questionar valor
- Não escalar IA sem evidência de valor

Responsáveis por papel, não por centralização

Frente	Owner principal	Evidência de avanço
Pessoas/capacidade	Coordenação + TL	owners e backups definidos
Operação/jornadas	TL + owners	SLOs, alertas e rotina ativa
Modernização/FinOps	Engenharia + Cloud	ondas, custos e roadmap 2028
Consumidores	Produto + Coordenação	prioridades e trade-offs pactuados
IA	Owner do time	baseline x piloto: fluxo, qualidade e capacidade
Fornecedor	Coordenação + owner técnico	conflitos com rito e escalonamento claro

Indicadores: baseline primeiro; medir fluxo, qualidade e capacidade — inclusive nos experimentos de IA

D30 | Baseline

- capacidade Run x Change x Modernização
- incidentes recorrentes e MTTR
- custos AWS por workload/jornada
- concentração de conhecimento

D90 | Tendência

- quick wins percebidos pelo negócio
- jornadas críticas mais observáveis
- piloto de IA medido no fluxo ponta a ponta
- redução de retrabalho e conflitos

D180 | Resultado

- time decide mais sem escalonar
- roadmap 2028 protegido
- FinOps incorporado à governança
- operação mais previsível e resiliente

Mensagem central: a coordenação não será dona de todas as respostas; será dona do contexto, da priorização, dos limites e da evolução da autonomia do time.

Evidências concretas da minha atuação atual

Exemplos selecionados para mostrar comportamentos que já pratico como Tech Lead e que pretendo ampliar como Coordenador.

Minha evolução de atuação

Organizo

Direciono

Desenvolvo

Delego

Acompanho

Autonomia

1. Squad: ownership e autonomia

Cenário

Capacidade reduzida, prioridades concorrentes, dependências e acompanhamento próximo.

Ação

Rotacionei assuntos entre membros, criei donos por demanda e apoiei tecnicamente nos gaps.

Evid.

Mais autonomia, senso de pertencimento e evolução da previsibilidade percebida pela gestão.

2. Performance e conversas difíceis

Cenário

Clima e performance passaram a impactar a Squad e as entregas.

Ação

Aprendi que adiar feedback aumenta custo; hoje atuo antes, com transparência e contexto.

Evid.

Aprendizado gerencial: proteger o coletivo exige conversas difíceis no tempo certo.

3. Sucessão, owners e backups

Cenário

Conhecimento e decisões ainda concentrados em algumas pessoas-chave.

Ação

Deleguei frentes, dei espaço para potenciais sucessores e acompanhei comunicação, visão e urgência.

Evid.

Liderança mais distribuída e redução gradual da dependência do Tech Lead.

4. IA aplicada ao trabalho

Cenário

Adoção desigual de IA: muitos low users e resistência inicial ao uso prático.

Ação

Conectei Copilot, Devin, Claude, BMAD/HIVE e AI-DLC a problemas reais de delivery.

Evid.

Evolução para mais heavy users quando o valor da IA fica concreto no fluxo de trabalho.

5. Capacidade, MVPs e renúncia

Cenário

Demandas concorrentes, pressão por entrega e capacidade limitada.

Ação

Quebrei Markit/Confirmation em MVPs, explicitando trade-offs para entregar valor tático.

Evid.

O negócio recebe benefícios antes; os MVPs seguintes reduzem risco e endereçam ajustes.

Ao final de 180 dias, o time deve decidir sem mim

- priorizar incidentes pelos critérios definidos;
- negociar capacidade e trade-offs com contexto;
- conduzir experimentos de IA com métrica;
- propor caminhos técnicos dentro do roadmap;
- escalar só prioridade, risco, orçamento ou conflito entre áreas.

Mensagem central

Eu organizo o contexto → dou direção → desenvolvo pessoas → delego com limites → acompanhamento por evidências.

O objetivo é o time funcionar melhor com menos dependência da minha atuação direta.

Como contar se a banca aprofundar: Cenário → Ação/decisão → Evidência/aprendizado. Manter a narrativa em liderança, decisão, autonomia e resultado — não em detalhe técnico isolado.
